

PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA

RESPUESTA A HURACÁN OSCAR
OCTUBRE 2024



Elaborado con el apoyo de



OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por crisis reciban la asistencia y la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población afectada por crisis y proporciona liderazgo para la movilización de la asistencia y los recursos por parte del sistema humanitario.

www.unocha.org/rolac

Twitter @UNOCHA_Americas

Foto de portada: UNCT Cuba

Plan de Acción Sistema de Naciones Unidas en Cuba

en respuesta a los efectos del Huracán Oscar en la provincia de Guantánamo

busca **\$33,2M** para apoyar a más de **478K** personas afectadas en sus necesidades básicas.



Tabla de contenido

04	Perspectiva general de la situación
05	Población afectada
06	Afectaciones más urgentes
08	Respuesta de las autoridades nacionales
09	Respuesta del sistema de Naciones Unidas
09	Objetivos estratégicos
10	Estrategia de la respuesta
12	Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
13	Albergues Temporales, Vivienda y Recuperación Temprana
15	Educación
16	Logística
17	Salud
18	Seguridad Alimentaria y Nutrición
20	Anexo: Lista de proyectos por sector


Perspectiva general de la situación

En medio de una compleja situación energética nacional, el 20 de octubre el huracán Oscar tocó tierra en la parte oriental de Cuba como un huracán de categoría 1. El sistema generó vientos de más de 130 km/h en las proximidades de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Su devastador paso por la región oriental afectó a casi medio millón de personas, de las cuales cerca de 150,000 sufrieron daños críticos. Hasta el momento se reporta el fallecimiento de siete personas.

El huracán Oscar, con una velocidad de traslación de sólo 4 km/h, se mantuvo en la región oriental, principalmente en la provincia de Guantánamo durante 25 horas. En este período, estas regiones fueron azotadas por severas lluvias, con acumulados de hasta 600 mm en algunas áreas, que acompañados por fuertes vientos, provocaron una situación de emergencia crítica en esas localidades que usualmente enfrentan los desafíos de la sequía.

A más de 72 horas posterior al evento, persistían fuertes inundaciones y crecidas de ríos y continuaban las labores de rescate en zonas de difícil acceso. Al 25 de octubre, fuertes lluvias continúan afectando la parte oriental del territorio, complicando las labores de búsqueda y rescate y la respuesta a la población afectada. La mayor parte de la provincia reporta varios días sin servicio eléctrico, aun antes del impacto del huracán, lo que dificulta el acceso a agua potable, alimentos y servicios de salud. Adicionalmente, la falta de fluido eléctrico ha complicado la transmisión de reportes de la situación en el territorio, lo que ha dificultado la identificación detallada del impacto de la emergencia. La complejidad de la situación en Guantánamo es tal, que se mantuvo parte de la provincia en fase de alarma ciclónica aun 4 días posterior al paso del Huracán, aunque la Defensa Civil ha declarado la vuelta a la normalidad en el resto de las provincias.

Trayectoria del Huracán Oscar, incluyendo intensidad y acumulados de precipitación.

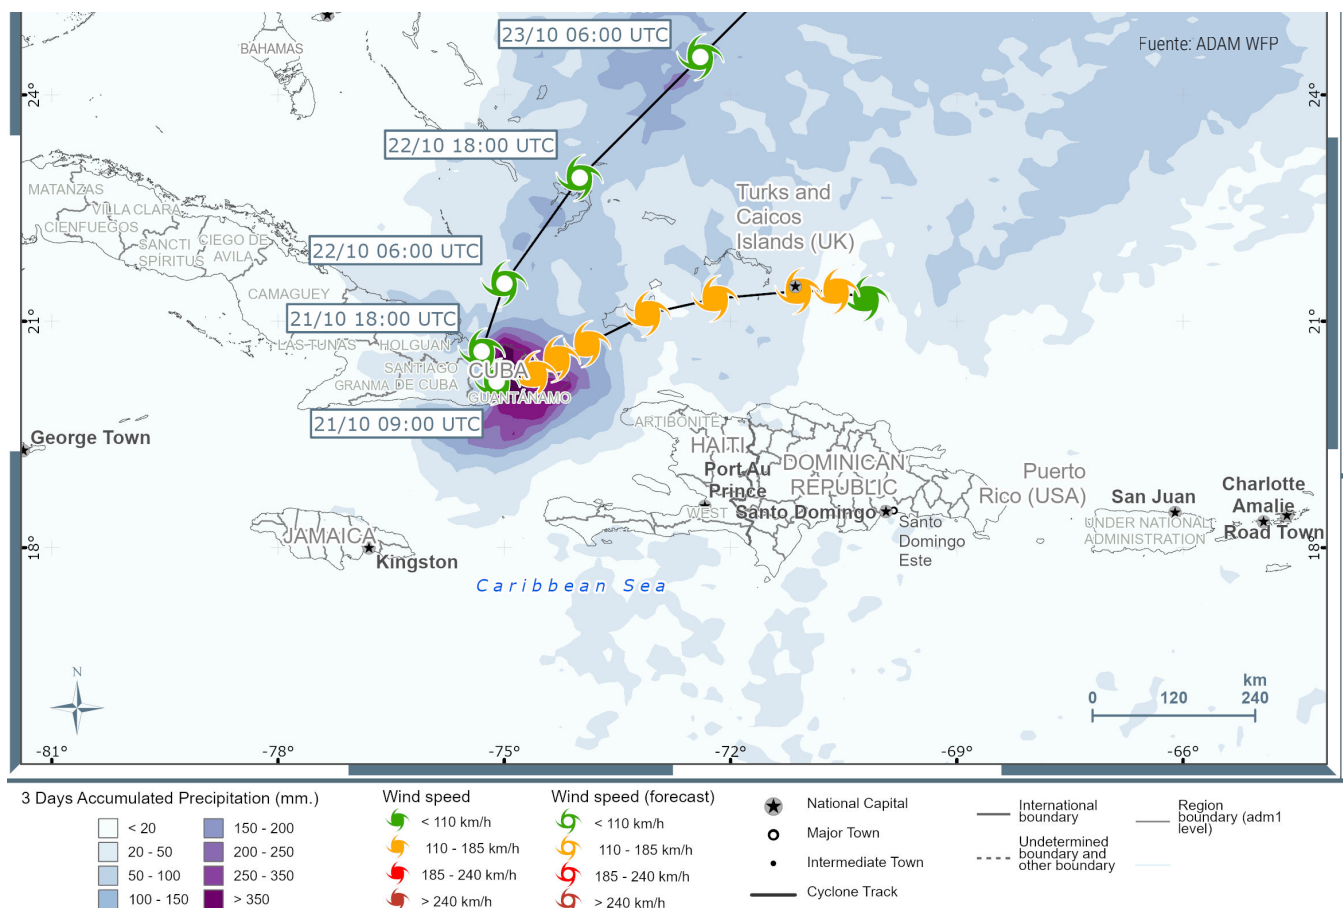

Población afectada



Áreas más afectadas y población con afectaciones más críticas a raíz del impacto del Huracán Oscar en Cuba

478.599 PERSONAS

Población total afectada

149.964 PERSONAS

Población con afectaciones más críticas

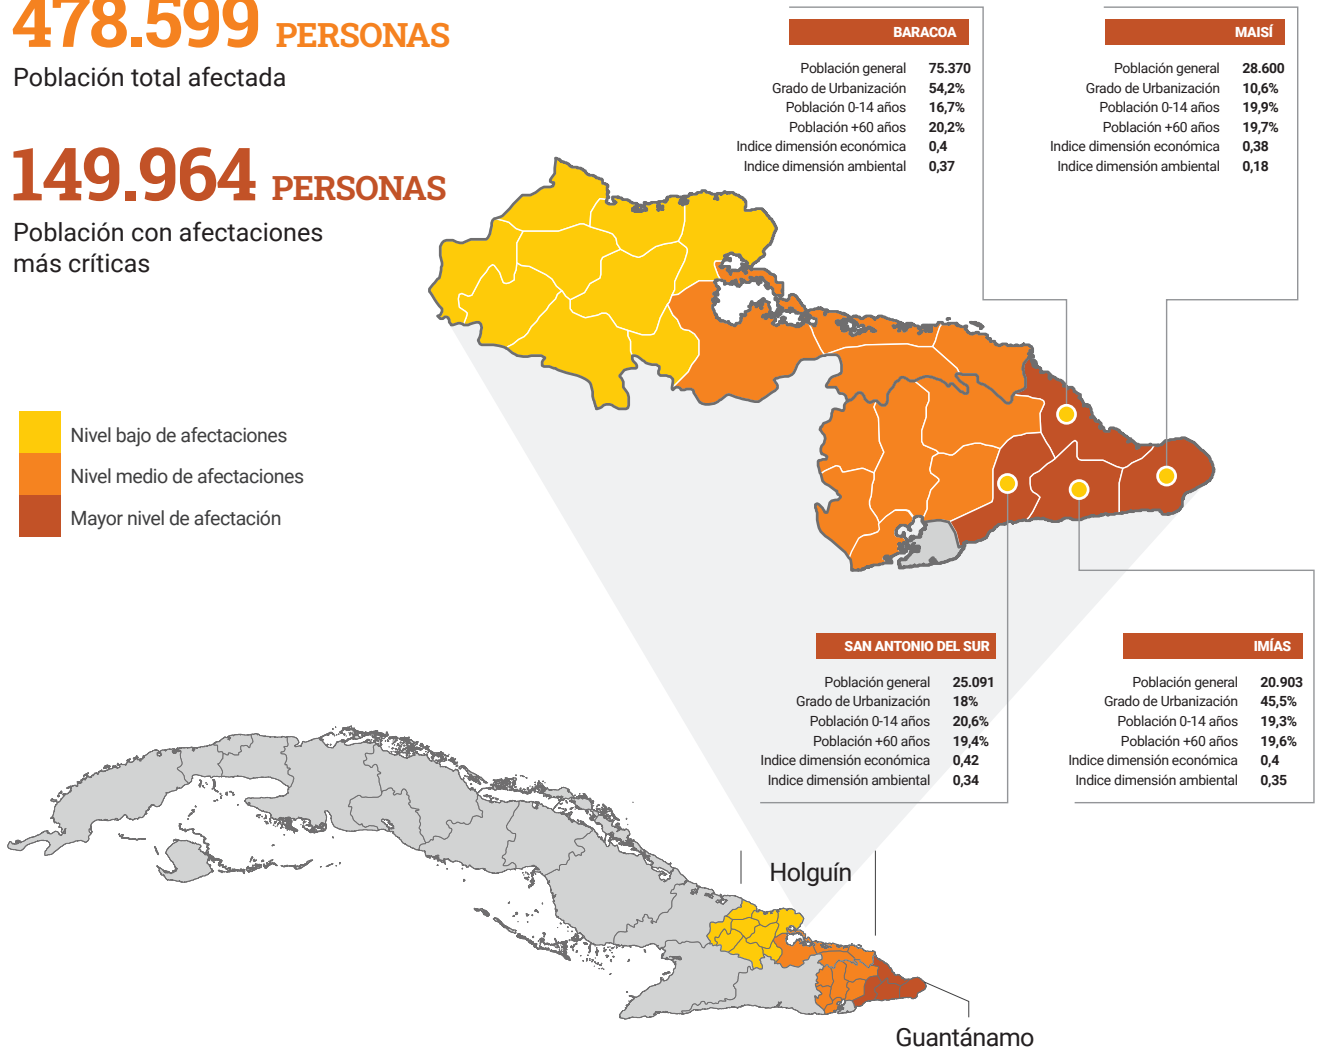

Escala de IDHM ● Muy Alto $\geq 0,55$ ● Alto 0,50 - 0,54 ● Medio 0,45 - 0,49 ● Bajo $\leq 0,44$

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano. Cuba 2019. Asenso a la raíz: La perspectiva local del desarrollo humano en Cuba (PNUD-CIEM, 2021)

Afectaciones más urgentes

Decenas de miles de personas han perdido todas sus pertenencias y bienes de primera necesidad, incluyendo alimentos, medios de cocción, medios de almacenamiento de agua, higiene, colchones, y equipos electrodomésticos. Hasta el momento, evaluaciones preliminares indican que más de 14.300 viviendas o instalaciones de servicios han sufrido daños importantes y más de la mitad de estas experimentaron colapsos totales de techo, lo que resultó en la pérdida total de sus bienes de primera necesidad en la totalidad, además de los daños en viviendas inundadas. Se estima que este número podría continuar aumentando a medida que avance la cuantificación de daños en los territorios incomunicados por inundaciones e interrupción de la infraestructura. Se identifican también daños en instalaciones de servicios comunitarios vitales como instituciones de salud, centros de distribución de alimentos, en el abasto de agua, servicios de saneamiento, almacenes, farmacias y escuelas. Se ha afectado gravemente la agricultura y las instalaciones de procesamiento de alimentos, complejizando el acceso a alimentos y a los medios de vida de la población.

Se registran preliminarmente daños en 56 instalaciones de salud pública en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y Guantánamo, incluidos un hospital general, policlínicos, consultorios del médico de la familia y farmacias con impactos sobre equipos médicos esenciales, los servicios del programa materno infantil, entre otros. La presente situación aumenta significativamente el riesgo de brotes de enfermedades, en particular las arbovirosis. Guantánamo había sido identificado por las autoridades sanitarias como uno de los territorios con los niveles más altos de infestación de vectores, en un contexto nacional de alta prevalencia de dengue y fiebre de Oropouche.

De los 349 centros educativos existentes en los municipios Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur, se identifican daños entre totales y parciales en 150 instituciones (43%) con afectaciones también en el

mobiliario escolar y pérdida de los materiales escolares (libros, libretas, utensilios escolares y otros).

Más de 15000 hectáreas de tierra quedaron afectadas, con cuantiosas pérdidas de cultivos de alimentos. Adicionalmente, existen afectaciones en las capacidades de almacenamiento, cocción y conservación de alimentos en hogares e instituciones, incluidas las que apoyan redes de protección social. A esto se suma que la mitad de la producción salinera en el municipio de San Antonio del Sur y casi la totalidad del cultivo de café en los territorios afectados, ambos medios de vida fundamentales de los pobladores de la zona quedaron destruidos, lo que podría añadir desafíos en materia de empleo y sustento económico de las familias.

Los críticos daños al sistema electro-energético local han afectado directamente el abasto de agua, además de los daños severos a la infraestructura de agua y la pérdida de tanques y sistemas de recolección y distribución de agua en viviendas e instituciones. Las roturas en sistemas hidráulicos y carreteras ocasionan serias limitaciones al acceso a agua segura y saneamiento en estos territorios, servicios vitales para sobrevivencia y prevención de brotes de enfermedades de origen hídrico-sanitario y vectorial. Además, las familias han perdido sus insumos de higiene personal, limitando la capacidad de prevención de enfermedades.

El impacto del huracán se produce a la vez que el país se encuentra en un contexto de emergencia energética debido al deterioro de la infraestructura de electricidad y la escasez de combustible, en un escenario de sanciones unilaterales externas. En el momento del impacto, las autoridades trabajaban por restablecer su sistema electro-energético nacional cuya desconexión había provocado afectaciones en los servicios básicos, incluido el acceso al agua potable, el saneamiento y la conservación de alimentos.

Los esfuerzos nacionales han sido inmediatos para rescatar y atender a los afectados. Sin embargo, los

daños son devastadores. Se requiere urgentemente acompañar a las autoridades nacionales en los esfuerzos para proteger a los grupos vulnerables y restablecer los servicios esenciales que continúan en condiciones difíciles y/o suspendidos.

Cuba está excluida de las principales instituciones financieras internacionales y se enfrenta a un acceso extremadamente limitado a los mercados internacionales

de capitales, lo que dificulta enormemente la financiación de la respuesta ante situaciones de desastres y el desarrollo. Ante el destructivo impacto, es crítico acompañar a Cuba en sus esfuerzos en curso de respuesta y recuperación.



Foto: Radio Baracoa

Respuesta de las autoridades nacionales

Como parte del Sistema de Defensa Civil, autoridades locales y nacionales trabajaron desde antes del impacto para evitar pérdidas humanas y materiales. El paso del Huracán Oscar coincidió con un contexto de emergencia energética que obligó a priorizar el traslado de grupos electrógenos a centros vitales, la distribución de carbón para la cocción de alimentos, la asignación de reservas de gas licuado a instituciones de salud y centros de evacuación, así como el fortalecimiento de las condiciones de almacenamiento para preservar mercancías. Unas 130 mil personas fueron evacuadas, en su mayoría a casas de familiares y amigos.

Actualmente, se realizan esfuerzos en la recuperación inmediata de los territorios más afectados. Se continúa trabajando en el restablecimiento de la red eléctrica, las redes de abasto de agua y otros servicios básicos, aunque estos objetivos enfrentan fuertes desafíos derivados de las grandes inundaciones, la crecida de ríos y los daños de infraestructura. El Sistema de Defensa Civil cubano avanza en la fase de recuperación, lo que incluye como

prioridad garantizar el acceso a decenas de miles de personas aún incomunicadas.

En paralelo a estas acciones, las organizaciones de masas y de la sociedad civil han generado un grupo de iniciativas para apoyar a la población de los territorios más afectados con donaciones voluntarias. El Banco Central de Cuba informó sobre la habilitación de varias cuentas oficiales por las que pueden realizarse donaciones en moneda nacional y divisas a favor de los damnificados por el huracán Oscar en provincias del oriente del país.

Dada la naturaleza del desastre, que sobrepasó todos los pronósticos de daños para la provincia de Guantánamo y especialmente los cuatro municipios más impactados, se requiere apoyar los esfuerzos en curso de esta respuesta nacional.

Respuesta del sistema de Naciones Unidas

El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba acompaña los esfuerzos nacionales de manera inmediata, con insumos preposicionados en el país como alimentos, lonas, techos, kits de higiene, torres de iluminación con generador, carpas para facilidades temporales y puestos de dirección de operaciones, kits de cocinas, almacenes móviles y pallets para el correcto almacenamiento de alimentos, tanques de agua, planta potabilizadora, kit insumos médicos, material escolar (PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF) y con otros ítems de primera necesidad y medicamentos que están llegando de manera inmediata al país (ACNUR, OPS/OMS, UNICEF).

A pocos días del huracán, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) autorizó por su lado un Emergency Cash Grant que proporciona financiamiento rápido para la compra de bienes de primera necesidad. El 30 de octubre, la Secretaria General Adjunta Interina de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia aprobó una contribución de \$3.5 millones del Fondo Central de Respuesta a

Emergencias de las Naciones Unidas (CERF, por sus siglas en inglés) para la respuesta inmediata del Sistema de las Naciones Unidas a las necesidades más urgentes en las zonas afectadas. Varias agencias (ACNUR, FAO, OPS/OMS, PMA, UNFPA, UNICEF, PNUD, OIM) han activado sus mecanismos internos de respuesta a emergencia, se encuentran movilizand recursos propios o reorientando fondos existentes.

El presente Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas en Respuesta al Huracán Oscar ha sido elaborado en diálogo con las autoridades nacionales y recoge la respuesta del sistema ante las severas afectaciones ocasionadas por el huracán Oscar y en apoyo a las personas y territorios más afectados.

Este plan está a disposición de todos los miembros de la comunidad internacional que deseen sumarse a esta respuesta.

Objetivos estratégicos

Este Plan de Acción tiene proyectos que abordan aspectos de respuesta inmediata y que se implementarán durante los primeros seis meses. Adicionalmente, otros proyectos continuarán hasta los 18 meses, fortaleciendo la transición hacia la recuperación.

Objetivos estratégicos:

1. **Acompañar las acciones nacionales de respuesta inmediata y la vitalidad de servicios básicos en sectores críticos, con prioridad en grupos de población en riesgo de vulnerabilidad.**
2. **Apoyar los esfuerzos iniciales de recuperación temprana, así como la reactivación de los medios de subsistencia en los territorios más afectados.**

Los sectores priorizados para esta respuesta:

- **Agua, saneamiento e higiene**
- **Albergues temporales, vivienda, y recuperación temprana**
- **Educación**
- **Logística**
- **Salud**
- **Seguridad alimentaria y nutrición**

Estrategia de la respuesta

POBLACIÓN TOTAL DE CUBA	PERSONAS EXPUESTAS	PERSONAS BENEFICIADAS	FINANCIAMIENTO REQUERIDO (USD)
10,06M	1,4M	478.328	33,24M


SECTOR	AGENCIAS	POBLACIÓN META	REQUERIDO (USD)
Agua, Saneamiento e higiene	UNICEF	478.328 149.693 personas (Respuesta inmediata)	7.500.000
Albergues temporales, Vivienda y recuperación temprana	PNUD, OIM, ACNUR, UNOPS, UNESCO, ONU- Habitat	90.000 personas (Respuesta inmediata) 478.328* personas (Recuperación temprana)	8.691.947
Educación	UNICEF, UNESCO	28.773	822.480
Logística	PMA	478.328	5.500.335
Salud	OPS-OMS, UNFPA, UNICEF	478.328 personas 149.693 personas (Respuesta inmediata)	3.120.000
Seguridad alimentaria y nutrición	PMA, FAO, UNICEF	478.328	7.600.405
Total		478.328	33, 235.167

* En el caso específico de los Sistemas de Alerta Temprana, se beneficiará una población de 720,600, superior a la cifra de la provincia.

Población meta por sector de respuesta



Requerimientos financieros por sector de respuesta

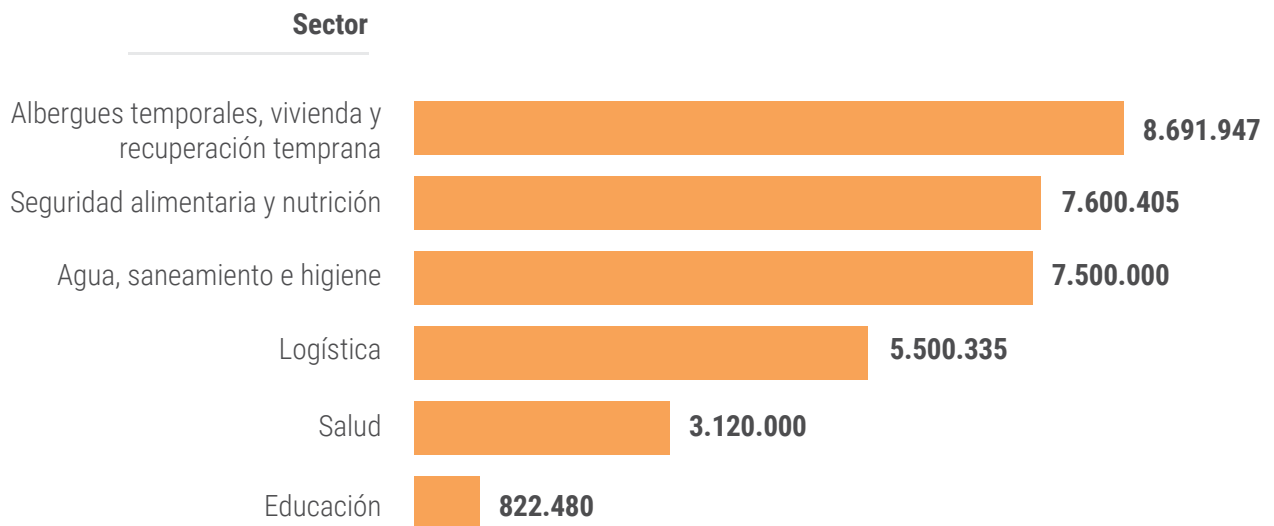

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)



POBLACIÓN META

149.693 personas (Respuesta Inmediata)

478.328 personas (Recuperación temprana)

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

7,5M

Agencias participantes: UNICEF

Contacto:

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba

Email: atrossero@unicef.org

Impacto

Servicios WASH son esenciales para la sobrevivencia humana y para la prevención de brotes de enfermedades hídrico-sanitaria y vectoriales, que afectan a todas las personas, con un impacto más agudo en niños y niñas. Las afectaciones en el abasto de agua en la provincia y en especial en los 4 municipios más golpeados por Oscar son severas, con pérdidas de infraestructura, equipos de bombeo, medios de almacenamiento, y las conductoras de los sistemas de abastos. Se ha activado el suministro de agua por camiones cisterna para las comunidades con el servicio interrumpido. A nivel de hogar, producto de las inundaciones, las familias perdieron insumos básicos de almacenamiento y tratamiento de agua, y sus artículos de higiene personal. Además, con las 60,000 personas afectadas por danos en vivienda, se encuentran afectaciones a sus infraestructuras sanitarias domésticas. Instituciones, educativas y de salud, han sufrido severas afectaciones en sus infraestructuras de agua, saneamiento e higiene. Con el descenso de las aguas de inundaciones, es fundamental asegurar condiciones sanitarias y medioambiental, con manejo de desechos, tratamiento y disposición apropiadas. Se han identificado necesidades de equipamiento y suministros para camiones de alta presión y limpia fosas. Además, asegurar condiciones seguras de saneamiento a nivel de hogar e institucional es fundamental para asegurar

la salud de las personas afectadas. Según autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el fallo del sistema electro-energético nacional paralizó el 84% de las estaciones de bombeo de agua del país. Solo se mantuvo el 16%, con 611 bombas con paneles solares y 70 sistemas se abastecen por gravedad. Más de 3 millones de habitantes afectados sin servicio de agua en el país, con un fuerte impacto en los territorios afectados por Oscar.

Principales actividades del sector

- Proveer agua segura para consumo a nivel de hogar, comunitario e institucional (educativo y de salud) contribuyendo a la prevención y control de enfermedades de origen hídrico y otras enfermedades vectoriales.
- Proveer servicios sanitarios para las personas afectadas a nivel de hogar, comunitario e institucional - asegurando un manejo seguro de desechos, previniendo enfermedades y la contaminación medioambiental y de fuentes hídricas.
- Promover la higiene y movilización comunitaria para limpieza medioambiental, asegurando condiciones sanitarias e higiénicas que eviten brotes de enfermedades de origen hídricas y vectoriales.
- Proveer insumos WASH como kits de higiene que incluye almacenamiento y tratamiento de agua a nivel de hogar, jabón para higiene personal, insumos de higiene menstrual para niñas y mujeres, entre otros insumos clave.

Albergues Temporales, Vivienda y Recuperación Temprana



POBLACIÓN META

90.000 personas (Respuesta Inmediata)

478,328 personas (Recuperación temprana)

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

8,7M

Agencias participantes:

PNUD, OIM, ACNUR, UNOPS, UNESCO, ONUHABITAT

Contactos:

Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba

Email: fernando.hiraldo@undp.org

Sonia Karakadze, Coordinadora de Programa,
Jefa de Oficina, OIM-Cuba

Email: skarakadze@iom.int

Laura Sola, Jefa de Oficina ACNUR-Cuba

Email: SOLA@unhcr.org

Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba

Email: a.lemaistre@unesco.org

Laura Klarreich, Asesor Senior de Portafolio UNOPS

Email: marialk@unops.org

Elkin Velásquez Monsalve, Representante ONU Habitat

Email: Elkin.velasquez@un.org

Impacto

El Huracán Oscar ha dejado cerca de 60,000 personas afectadas por daños diversos en viviendas. Derrumbes totales y parciales, así como la pérdida total o parcial de techos. Alrededor de 90 000 personas, incluyendo las que sufrieron afectaciones en vivienda, han perdido medios de habitabilidad básica y subsistencia por el impacto de las inundaciones como: colchones, medios de cocción, higiene, así como carentes de energía eléctrica. El impacto de las inundaciones ha sido mayor en Imías (que aún se encuentra incomunicado) y en San Antonio del Sur.

Además, se han reportado daños en el Museo Municipal Fuerte Matachín - Fortaleza española del siglo XVIII y Casa de la Cultura "Cecilio Gómez Lambert" de Baracoa (edificación patrimonial de fines del siglo XIX).

Principales actividades del sector

Respuesta inmediata

- Crear condiciones mínimas de refugio de carácter temporal para poblaciones afectadas, priorizando mujeres y grupos vulnerables, a través de facilidades temporales y viviendas refugio en las viviendas afectadas, así como en albergues.
- Crear condiciones de habitabilidad básicas/ Kits básicos de vida, como: colchones, medios para el consumo de alimentos y agua segura, set de sábanas, toallas, mosquiteros, lámparas solares, kits de higiene, etc. para complementar las condiciones en soluciones de refugio, así como en viviendas que perdieron los bienes por inundaciones y para las personas protegidas en albergues y en casas de familias, amistades y vecinos.

Recuperación Temprana

- Crear condiciones de habitabilidad segura en las viviendas de poblaciones afectadas mejorando las soluciones de refugio inmediato creadas en la respuesta inmediata, priorizando los grupos vulnerables y mujeres, con techos seguros y fortaleciendo brigadas con medios de reconstrucción, así como la asesoría técnica y trámites a la población, asegurando la preparación de obreros y técnicos.

- Fortalecer la producción local de materiales de construcción, utilizando recursos locales (arcillas, canto, maderas, etc.) y reciclaje, y transfiriendo tecnologías apropiadas; así como transferir técnicas de construcción con recursos locales que permitan responder con celeridad.
- Recuperar y revitalizar Sistema de Alerta Temprana meteorológico e hidrológico (MH), restableciendo los sistemas de vigilancia MH, las comunicaciones y el aviso oportuno a la población, así como el fortalecimiento de las capacidades de Gestión de Riesgos de Gobiernos y actores clave en municipios vulnerables.
- Apoyar la revitalización de soluciones energéticas para mantener la vitalidad de servicios básicos de la comunidad en los municipios afectados, priorizando instalaciones de FRE, en viviendas y servicios.
- Recuperar bienes patrimoniales y culturales, priorizando los afectados en la ciudad de Baracoa.

Educación



POBLACIÓN META

23.525 Niñas, niños y adolescentes

5.248 docentes

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

822.480

Agencias participantes: UNICEF, UNESCO

Contactos:

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba
Email: atrossero@unicef.org

Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba
Email: a.lemaistre@unesco.org

Impacto

Las evaluaciones del Ministerio de Educación indican que al menos 150 instituciones educacionales, incluyendo 2 instalaciones recreativas y la dirección municipal de educación de Imías fueron afectados por el paso del huracán Oscar. Estas afectaciones están concentradas en la provincia de Guantánamo, en los municipios Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur e Imías. Autoridades locales de la provincia oriental han compartido daños preliminares que afectan, al menos, a unos 23,525 niños, niñas y adolescentes y 5,248 docentes. De los 349 centros educativos existentes en los 4 municipios reportados, se identifican 150 centros educativos afectados (43% del total). De los centros educativos dañados, 4 son círculos infantiles, 4 casitas infantiles, 5 centros mixtos, 108 primarias, 3 escuelas especiales, 14 secundarias básicas, 4 preuniversitarios, 3 centros de enseñanza técnico profesional y 2 escuelas pedagógicas. Las principales afectaciones se concentran en los siguientes recursos: techos, luminarias, mobiliario y material escolar, pizarras, y colchones y literas de las instituciones internas.

Principales actividades del sector

- Proveer techos e insumos necesarios para la rehabilitación de 150 escuelas de los cuatro municipios más afectados: Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías, en coordinación con el sector de Vivienda y Recuperación Temprana.
- Proveer tazas sanitarias, insumos de almacenamiento de agua (tanques y tanquetas) y otros medios que garantizan condiciones higiénicas y de saneamiento seguro en las escuelas afectadas de los municipios : Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías, en coordinación con el sector de Agua, Saneamiento e Higiene.
- Proveer Kits de para niños de la primera infancia en círculos infantiles, casitas infantiles y Programa Educa a tu hijo de los municipios de Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías.
- Proveer kits de material escolar para niños, niñas y adolescentes de enseñanza general de municipios más afectados.
- Proveer kits de recreación para el apoyo socioemocional post-desastre de estudiantes de los centros escolares de municipios más afectados.
- Capacitar al personal docente para que brinden una adecuada educación para la atención socioemocional post desastre a los niños, adolescentes y jóvenes afectados.
- Elaborar y difundir materiales transmedia para favorecer el bienestar integral de NNA y un retorno a clase.

Logística



POBLACIÓN META

478.328

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

5,5M

Agencias participantes: PMA

Contacto: Etienne Labande, Representante PMA-Cuba

Email: etienne.labande@wfp.org

Impacto

Se reportan severos daños de infraestructura en tramos de puentes, carreteras y caminos que dificultan accesos y comunicación, y la distribución rápida de las ayudas. Como consecuencia de la influencia de los vientos y las zonas inundadas, han sido identificados daños en instalaciones de servicios públicos como almacenes de la red mayorista y minorista de alimentos, centros de distribución de alimentos, red de comercios locales, farmacias, escuelas e instituciones de salud. La crisis energética y el déficit de combustible, sumado los daños a la red de distribución eléctrica por el impacto de los fuertes vientos, han dificultado las labores de respuesta y recuperación.

Principales actividades del sector

- Apoyar la entrega de carpas para facilidades temporales a la población afectada y puestos de dirección de operaciones de respuesta.
- Contribuir a la recuperación de las capacidades de almacenamiento y distribución, enfatizando en los almacenes de los municipios más afectados mediante almacenes móviles con pallets y luminarias.

- Contribuir al fortalecimiento de capacidades para el respaldo energético de las comunicaciones y otros servicios básicos en situaciones de emergencia mediante el uso de generadores diésel y paneles solares.
- Fortalecer las capacidades logísticas en la cadena de distribución de alimentos mediante la adquisición de neumáticos y baterías.
- Apoyar la facilidad de combustible para garantizar los servicios de transportación asociados a la respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Oscar desde las entidades de Gobierno a cargo de la logística de esta operación de emergencias, así como el funcionamiento de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba (4000 TM).

Salud



POBLACIÓN META

478.328

149.693

 personas (Respuesta Inmediata)

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

3,12 M

Agencias participantes: OPS/OMS, UNICEF, UNFPA

Contactos:

Dr. Mario Cruz Peñate, Representante OPS/OMS-Cuba
Email: cruzmari@paho.org

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba
Email: atrossero@unicef.org

Marisol Alfonso de Armas, Jefa de la oficina de UNFPA-Cuba
Email: alfonso@unfpa.org

Impacto

Las afectaciones al sector de la salud, tras el paso del huracán Oscar, incluyen daños de infraestructura principalmente de cubiertas, además pérdida de equipamiento médico y estomatológico, medios médicos e insumos de las instituciones y entidades. Esta situación complejiza su recuperación inmediata y la vitalidad de los servicios. Se cuenta con el reporte de 56 instituciones de salud dañadas, entre ellas el Hospital General: Octavio de la Concepción y Pedraza de Baracoa, 4 policlínicos y 33 consultorios de médicos de familias. En el caso del hospital municipal de Baracoa se ha reportado afectación de equipos médicos, y en las áreas administrativa y de soporte, áreas de esterilización, suministro de agua, sala de pacientes gestantes, terapia intensiva de adultos y pediátrica. Aun se están contabilizando las afectaciones de otras.

Principales actividades del Sector

- Proveer equipamiento y suministros esenciales para apoyar la rehabilitación de las funciones de las unidades de salud identificadas en las áreas afectadas por el huracán.
- Contribuir a la prevención de enfermedades infecciosas y eventos epidemiológicos, incluidos los provocados por el consumo de agua no potable y una deficiente higiene, tales como las enfermedades de transmisión hídrica y por contacto en las instituciones de salud.
- Contribuir a la rehabilitación inmediata de los servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención y atención de las violencias por motivo de género, principalmente los servicios de salud materna, los servicios de planificación familiar y de atención a las ITS/VIH y atender las necesidades de higiene de mujeres en edad reproductiva con énfasis en embarazadas, de adolescentes, de personas con discapacidad, de personas de la comunidad LGBTI y adultas mayores, desde un enfoque de género y derechos.
- Fortalecer las capacidades del sistema provincial de salud y la rehabilitación de los servicios esenciales de salud materno-infantil del territorio a través de la adquisición de equipos, medicamentos y suministros médicos críticos.
- Apoyar la prevención de infecciones comunitarias y la promoción de cuidados adecuados en los primeros 1.000 días de la vida, con participación comunitaria.

Seguridad Alimentaria y Nutrición



POBLACIÓN META

478.328

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

7,6M

Agencias participantes: PMA, UNICEF, FAO

Contacto: Etienne Labande, Representante PMA-Cuba

Email: etienne.labande@wfp.org

Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba

Email: marcelo.resende@fao.org

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba

Email: atrossero@unicef.org

Impacto

En la provincia de Guantánamo, aún se continúa evaluando los daños en el sector, pero ya se han reportado graves afectaciones en el sector agrícola con más de 4.000 hectáreas de hortalizas, 750 hectáreas de plátano, 1117 toneladas de frijol. En el sector agroforestal se dañaron 4648 ha de café, 3782 ha de cacao y 153 ha de coco. En el sector ganadero, se informa de afectaciones en el techado de instalaciones vinculadas al ganado menor, mientras que en el sector pesquero ocurrieron daños en la infraestructura de centros de procesamiento de productos pesqueros. En los 4 municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maísí y Baracoa, se perdieron 1786 hectáreas de cultivos, más de 200 hectáreas de semilleros que respaldaban 2 mil hectáreas de siembras, que incluye 27 casas de cultivo en el módulo del Valle de Caujerí, así como 32 800 latas de café. En el plátano, se estima que casi el 50 % de las plantaciones han sido dañadas, llegando a un 70 u 80 % en Baracoa y Maísí.

Adicionalmente, existen afectaciones en las capacidades de almacenamiento, cocción y conservación de alimentos en hogares e instituciones, que se suma a una situación de partida muy compleja, ante la emergencia energética nacional, con efectos en el abasto de agua y la pérdida de

alimentos almacenados, lo que se complejiza con desafíos precedentes en el suministro estable de la canasta familiar normada. Las fuertes inundaciones afectaron de forma crítica las reservas locales de alimentos, los cultivos y medios de vida, limitando la disponibilidad y el acceso a los alimentos, en la provincia de Guantánamo, principalmente en los cuatro municipios más afectados: San Antonio del Sur, Imías, Maísí y Baracoa.

Principales actividades del sector

- Brindar asistencia alimentaria inmediata con alimentos y sets de cocción y consumo a toda la población más afectada, mientras se mantiene la entrega del módulo bimestral de arroz, granos y aceite a personas en situación de vulnerabilidad y mujeres embarazadas para evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones con énfasis en grupos priorizados.
- Apoyar la entrega de alimentos a las personas más afectadas y grupos priorizados y más vulnerables, a través de instituciones de protección social que estén funcionales y habilitadas para ofrecer el servicio de alimentación desde la respuesta inmediata y durante la recuperación (ej. centros de evacuación, comedores comunitarios, círculos infantiles, escuelas primarias, Hogares Maternos, Sistemas de Atención a la Familia, Hogares de Ancianos, Casas de Abuelos y otros centros en las comunidades).
- Contribuir a la prevención de la malnutrición por deficiencia de micronutrientes con la distribución de suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo y tabletas prenatales) a niñas y niños de 6 a 59 meses, así como de mujeres embarazadas, y acompañar la promoción de la lactancia materna

- exclusiva y prácticas adecuadas de alimentación complementaria en la provincia.
- Apoyar la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto y de ganado ovino y caprino para la producción local de vegetales y proteína de origen animal destinada a más de 140 000 pobladores de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo.
 - Contribuir a la recuperación de los medios de vida de los productores agrícolas y pesqueros, y los productores agroforestales de café, cacao y coco en las zonas montañosas.

Anexo: Lista de proyectos por sector

Foto: UNCT Cuba



AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo inmediato y recuperación temprana para restablecer el acceso a agua segura, saneamiento e higiene de las familias en riesgo de vulnerabilidad, instituciones públicas escolares y de salud, y comunidades afectadas de la provincia de Guantánamo.
OBJETIVO(S)	Asegurar el acceso a agua segura para consumo a nivel de hogar, comunitario e institucional –incluyendo bombeo, tratamiento, almacenamiento y distribución. Provisión de servicios sanitarios para las personas afectadas a nivel de hogar, comunitario e institucional - asegurando un manejo seguro de desechos, previniendo enfermedades y contaminación hídrico-sanitarias, vectoriales y la contaminación medioambiental y de fuentes hídricas.
POBLACIÓN META	149,693 personas (Respuesta Inmediata) con abasto de agua segura. 478,328 personas (Recuperación temprana) con abasto de agua de forma segura y sostenible, medios para almacenamiento y saneamiento adecuado.
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 5,400,000USD Movilizados: 50,000 USD Requerimientos Netos: 5,350,000USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Mejora de condiciones ambientales y de saneamiento en comunidades más afectadas de la provincia de Guantánamo a través de insumos para uso doméstico y acciones comunitarias.
OBJETIVO(S)	Apoyar el saneamiento e higienización de las comunidades afectadas a través de acciones comunitarias, evitando contaminación medioambiental y de fuentes hídricas. Provisión de insumos WASH a nivel de hogar con kits de higiene que incluye almacenamiento y tratamiento de agua a nivel de hogar, insumos de higiene personal, insumos de higiene menstrual para niñas y mujeres, entre otros insumos clave.
POBLACIÓN META	478,328 personas (insumos para camiones de saneamiento, motobombas, equipamiento para operarios).
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 2,100,000 USD Movilizados: -105,000 USD Requerimientos Netos: 1,995,000 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

ALBERGUES TEMPORALES, VIVIENDA Y RECUPERACIÓN TEMPRANA

RESPUESTA INMEDIATA

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Restablecimiento de condiciones de refugio inmediatos a través de facilidades temporales y viviendas refugio, y acceso a medios básicos de habitabilidad priorizando mujeres y grupos vulnerables; en los municipios más afectados por el huracán Oscar en la provincia Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Crear refugios unifamiliares a través de facilidades temporales de unos 20 m2 en viviendas totalmente destruidas • Crear refugio para 2 familias (allegadas) en viviendas refugio de unos 35 m2, en viviendas que perdieron el techo • Crear condiciones de habitabilidad básicas, colchones, kit de cocina, almacenamiento de agua segura, set de sábanas, toallas, mosquiteros, lámparas solares, kits de higiene, etc, Reposición del reposicionamiento de bienes no alimentarios de primera necesidad, con el fin de garantizar la rápida ayuda a la población ante nuevas situaciones de emergencia.
POBLACIÓN META	13,750 familias que perdieron sus viviendas y bienes de primera necesidad (55,000 personas) 4,000 familias reciben medios pre posicionados para crear refugios
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 3 a 6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$ 2,000,000 USD Movilizados: 380,000 USD <ul style="list-style-type: none"> • \$40,000 USD (Recursos propios) • \$240,000 USD (Otros donantes: COSUDE, Chile, UE, BCIE) • \$100,000 OCHA Emergency Cash Grant Requerimientos netos: 1,620,000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	OIM – ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
TÍTULO DEL PROYECTO	Creación de facilidades temporales para albergados de los 4 municipios más afectados en Guantánamo: San Antonio del Sur, Imías, Baracoa y Maisí.
OBJETIVO(S)	Mejorar de calidad de vida de las personas protegidas en albergues y en viviendas de familiares amigos y vecinos asegurando un Kit de medios básicos de vida, Artículos no alimentarios (NFI): set de sábanas, colchones, toallas, mosquiteros, lámparas solares, kits de higiene.
POBLACIÓN META	5,300 personas (1,325 familias) albergadas, de ellas 4865 personas en centros de evacuación y 443 resguardadas en viviendas de familiares, amigos y vecinos
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 3 a 6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$ 250,000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$250,000 USD
CONTACTO	Sonia Karakadze, Coordinadora de Programa, Jefa de Oficina, OIM-Cuba Email: skarakadze@iom.int

AGENCIA	ACNUR – ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
TÍTULO DEL PROYECTO	Medidas urgentes para el apoyo con medios de vida de primera necesidad, para la población de la provincia Guantánamo, afectada por el huracán Oscar.
OBJETIVO(S)	Apoyar con la distribución de bienes no alimentarios de primera necesidad, que garanticen a la población afectada, la rápida recuperación de sus medios de vida y la preparación para enfrentar nuevas situaciones de emergencia (sets de cocina, lonas de plástico, lámparas solares, mantas o colchas, colchonetas para dormir, tiendas de campaña familiares, mosquiteros).
POBLACIÓN META	<ul style="list-style-type: none"> • 16,560 lámparas solares (16560 familias / 49,680 personas, a razón de 1 lámpara solar por núcleo de 4 personas) • 10,200 esterillas • 7,200 mosquiteros (7,200 personas) • 6,192 mantas o colchas (9,288 personas) • 600 lonas plásticas (600 familias / 2,400 personas, considerando 1 por núcleo de 4 personas) • 520 sets de cocina (2,080 personas por núcleos familiares de 4 miembros) • 225 tiendas de campañas familiares ignífugas (200 para familias / 800 personas considerando núcleos de 4 miembros y 25 para habilitar servicios comunitarios, que pueden beneficiar a aproximadamente 20,000 personas)
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 3 a 6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	<p>TOTAL: \$548,222 USD</p> <p>Movilizados: 391,222 USD</p> <ul style="list-style-type: none"> • \$391,222 USD (Recursos propios) <p>Requerimientos netos: 157,000 USD</p>
CONTACTO	Laura Sola, Jefa de Oficina ACNUR-Cuba Email: SOLA@unhcr.org

AGENCIA	UNOPS – OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS
TÍTULO DEL PROYECTO	Piloto Asesoría Técnica en identificación y planificación de requerimientos de reconstrucción del municipio Imías.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación inicial del daño de las viviendas, instituciones de salud pública y educativas. • Evaluación inicial del daño de infraestructura vial y comunicaciones • Evaluación inicial del daño de servicios básicos, agua y energía • Definición y priorización de las necesidades • Plan de priorización de actividades de corto y mediano plazo considerando aspectos de resiliencia y sostenibilidad • Análisis de factibilidad. Riesgos y presupuesto • Coordinación Interinstitucional • Gestión de plataforma en línea de seguimiento de levantamiento (geolocalización de lugares afectados, fotografías) • Gestión de reuniones de priorización con contrapartes identificadas • Entregable: (i) Informe de relevamiento de situación actual en todas las categorías mencionadas (II) Presentación de alternativas de reconstrucción (iii) Plan de reconstrucción del Municipio Imías de alto nivel con presupuesto y tiempos estimados
POBLACIÓN META	Gobierno Provincial de Guantánamo, Municipios Imías,.

DURACIÓN DEL PROYECTO	3 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: USD 543,725 USD Movilizados: - Requerimientos netos: 543,725 USD
CONTACTO	Laura Klarreich, Asesor Senior de Portafolio UNOPS Email: marialk@unops.org

RECUPERACION TEMPRANA

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación de condiciones habitacionales seguras en los municipios afectados por el huracán Oscar en la provincia Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Crear condiciones de habitabilidad segura en las viviendas de poblaciones afectadas, priorizando los grupos vulnerables y mujeres. Se intervendrá en viviendas con soluciones de techo seguro mejorando las que temporalmente sirven de refugios en la fase de respuesta. • Fortalecer las capacidades de brigadas constructivas con medios para garantizar la reconstrucción segura • Fortalecer la Asistencia Técnica y servicios de trámites para garantizar la reconstrucción segura • Formación y preparación de obreros, técnicos y monitores para asesorar la colocación de techos, y la reconstrucción.
POBLACIÓN META	4,000 familias que perdieron sus viviendas (12,000 personas)
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 12 a 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$2,000,000 USD Movilizados: - Requerimientos netos: 2,000,000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Fortalecimiento de las capacidades locales de producción de materiales de construcción con el empleo de materias primas locales en los municipios afectados por el huracán Oscar en la provincia Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la producción local de materiales de construcción, utilizando recursos locales (arcillas, canto, suelo cemento) y reciclaje (plásticos), y transfiriendo tecnologías apropiadas. Transferir técnicas de construcción con recursos locales que permitan responder con celeridad ante la magnitud de las afectaciones. Fortalecer capacidades para el procesamiento de madera. Apoyar el adiestramiento de técnicos municipales y obreros, priorizando el empleo para jóvenes, e integrando a mujeres.
POBLACIÓN META	2,000 familias (8,000 personas) por año se benefician con el acceso a materiales de construcción básicos para reconstruir las viviendas. 250 profesionales, técnicos y obreros, 50 monitores preparados.
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 12 a 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$1,000,000 USD Movilizados: - Requerimientos netos: 1,000,000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación y fortalecimiento del Sistema Alerta Temprana (SAT) hidro-meteorológico, ante las vulnerabilidades creadas por el huracán Oscar e identificadas antes de su impacto.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> Restablecer el sistema de vigilancia meteorológico e hidrológico. Recuperar y revitalizar las comunicaciones entre las entidades claves del SAT y el aviso a la población. Potenciar las capacidades de los técnicos municipales y la información comunitaria en las zonas vulnerables. Fortalecer las capacidades de Gestión de Riesgos de Gobiernos y actores clave en municipios vulnerables para la toma de decisiones oportunas
POBLACIÓN META	728 600 habitantes. 478 599 de las comunidades más vulnerables de toda la provincia Guantánamo y otros 250,000 de Holguín y Santiago, dado el alcance del SAT. 100 profesionales y técnicos
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$ 700,000 USD Movilizados: - Requerimientos netos: 700,000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Potenciar el uso de fuentes renovables de energía (FRE) en áreas rurales de los municipios afectados por el huracán Oscar en la provincia Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la revitalización de soluciones energéticas para mantener la vitalidad de servicios básicos de la comunidad en los municipios afectados • Garantizar el suministro de energía eléctrica a viviendas aisladas e instalaciones que brindan servicios básicos, a partir de FRE. • Promover que el diseño de los planes de medidas, de gestión de riesgos ante desastres, se garantice la protección segura de las instalaciones de FRE ante eventos meteorológicos extremos.
POBLACIÓN META	55,000 personas, considerando viviendas y servicios básicos de la comunidad
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$ 500,000 USD Movilizados: - Requerimientos netos: 500,000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo al restablecimiento de viviendas e instituciones públicas de valor patrimonial, así como a la reactivación de la vida cultural y a la gestión de la cultura como bien público en el centro histórico de Baracoa.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitar, a la mayor brevedad posible, viviendas e instituciones públicas cuyo valor patrimonial impacta de manera directa en la recuperación de las fuentes de ingresos y medios de vida de la población. • Reactivar la vida cultural y la gestión de la cultura como bien público en el centro histórico de Baracoa, en aras del equilibrio socioemocional de la comunidad.
POBLACIÓN META	45,382 personas (22,103 hombres y 23,279 mujeres)
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$ 50,000 USD Movilizados: 50,000 USD Requerimientos netos: 50,000 USD
CONTACTO	Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba Email: a.lemaistre@unesco.org

AGENCIA	ONU HABITAT - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANO
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación resiliente de viviendas afectadas con techos seguros y acceso a energía renovable en los cuatro municipios más afectados de la provincia Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Promover el rápido retorno de las personas afectadas a través de la recuperación en forma segura de las viviendas dañadas. • Fortalecer la capacidad de respuesta de las brigadas locales en la reconstrucción de viviendas. • Asistencia técnica para lograr una reconstrucción resiliente sobre la base de Soluciones basadas en la naturaleza y el uso de materiales locales. • Mejorar condiciones de vida a partir de la distribución de lámparas solares para facilitar el acceso a la iluminación a través de energía renovable a las familias afectadas por falta de fluido eléctrico. • Instalar paneles fotovoltaicos de energía en comunidades aisladas afectadas y brindar asistencia técnica para promover la sostenibilidad del sistema. • Actualizar los planes de ordenamiento territorial de los cuatro municipios afectados a partir de la identificación de las nuevas vulnerabilidades. • Incrementar la sensibilización de la percepción del riesgo de desastres por parte de la población en los cuatro municipios afectados. • Agilizar los trámites de levantamiento de daños y rehabilitación habitacional a través de los servicios que brindan las Oficinas de Trámites de Ordenamiento territorial y la Vivienda para la protección y el derecho a la vivienda adecuada de las personas afectadas en la habitabilidad por el huracán Oscar en los cuatro municipios más impactados de la provincia de Guantánamo. <p>Comprende: módulos de techos con láminas y purlings, herramientas especializadas para las brigadas constructoras, incluyendo motosierras que contribuyan con la recuperación de viviendas en zonas rurales y con el acceso a comunidades aisladas, lámparas solares para uso de las familias, lámparas solares led con sensor de movimiento y encendido automático en espacios públicos y sistemas fotovoltaicos autónomos. Elaboración y distribución de manuales técnicos y guías familiares para reconstruir mejor.</p>
POBLACIÓN META	<ul style="list-style-type: none"> • 20,000 personas beneficiadas, con prioridad para las más vulnerables: embarazadas, madres solteras, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad y enfermedad. • 5,000 viviendas que restablecen sus condiciones mínimas de habitabilidad para el retorno de las familias, la totalidad con lámparas solares y de ellas 200 con FRE. • 60 técnicos de las brigadas constructoras que fortalecen su capacidad de respuesta. • 100 técnicos que fortalecen sus capacidades para el levantamiento y evaluación de daños. • Indirectamente: población residente en los municipios donde están esas comunidades/viviendas, de los cuatro municipios más afectados de Guantánamo y altamente vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos extremos.
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$ 800,000 USD Movilizados: - Requerimientos netos: 800,000 USD
CONTACTO	Elkin Velásquez Monsalve, Representante ONU Habitat Email: elkin.velasquez@un.org

AGENCIA	ONU HABITAT - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANO
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación resiliente de viviendas afectadas con valor patrimonial en el centro histórico de Baracoa.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Potenciar la recuperación habitacional de Baracoa con la orientación del plan de ordenamiento urbano que permitan la recuperación garantizando el valor patrimonial de las viviendas afectadas en el Centro Histórico; se realizará un ejercicio piloto de recuperación de viviendas con techos seguros bajo el principio de preservar su valor patrimonial. • Fortalecer las capacidades para lograr una reconstrucción resiliente y adecuadas al valor patrimonial: Contribución a la construcción de un tejear para la fabricación de tejas acorde a las características patrimoniales de la Ciudad Primada de Cuba y asistencia técnica para la colocación de techos de forma segura con soluciones adecuadas y uso de tecnologías apropiadas a este entorno. • Fortalecer los conocimientos técnicos a través de la asesoría técnica a empresas públicas y emprendedores del sector privado, MIPYMES productoras de tejas y techeros para la potenciación de su capacidad productiva en la reconstrucción de viviendas. • Elevar la capacidad de recuperación de las brigadas locales de recuperación para la reconstrucción de viviendas considerando los valores patrimoniales. <p>Comprende: módulos de techos con láminas metálicas con diseño que simula las tejas cerámicas y soportería, equipamientos para el completamiento de un tejear que facilite la fabricación de tejas y elementos de construcción, herramientas especializadas para las brigadas constructoras. Elaboración y distribución de manuales técnico.</p>
POBLACIÓN META	<ul style="list-style-type: none"> • 14,000 personas beneficiadas, con prioridad para las más vulnerables: embarazadas, madres solteras, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad y enfermedad. • 500 viviendas que restablecen sus condiciones de habitabilidad con preservación de su valor patrimonial y 3,000 viviendas beneficiadas con otros elementos constructivos. • 30 técnicos de las brigadas constructoras que fortalecen su capacidad de respuesta. • 20 emprendedores del sector privado y estatal vinculado a la fabricación y colocación de tejas y otros elementos constructivos. • Indirectamente: población residente en el municipio Baracoa y altamente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos extremos.
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	TOTAL: \$ 300,000 USD Movilizados: - Requerimientos netos: 300,000 USD
CONTACTO	Elkin Velásquez Monsalve, Representante ONU Habitat Email: elkin.velasquez@un.org

EDUCACIÓN

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo para el rápido reinicio de actividades educativas en espacios de aprendizajes seguros y protectores para beneficiar a 23,525 estudiantes en 4 municipios afectados de Guantánamo.
OBJETIVO(S)	Proveer techos, equipamiento, mobiliario escolar entre otros insumos para la rehabilitación de escuelas afectadas de los cuatro municipios más afectados: Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías.
POBLACIÓN META	23,525 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 11,292 niñas y 12,233 niños de 1 a 18 años, más de 240 con algún tipo de discapacidad. 5,248 docentes.
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 428,392 USD Movilizados: 70,344 USD • \$70,344 USD (ECHO-UE) Requerimientos Netos: 358,048 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo para la recuperación de la infraestructura sanitaria de centros educativos afectados, de forma sostenible y resiliente, para beneficiar a 23,525 estudiantes en 4 municipios afectados de Guantánamo.
OBJETIVO(S)	Proveer tazas sanitarias, insumos de almacenamiento de agua (tanques y tanquetas) y otros medios que garantizan condiciones higiénicas y de saneamiento seguro en 68 escuelas de los cuatro municipios más afectados: Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías.
POBLACIÓN META	23,525 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 11,292 niñas y 12,233 niños de 1 a 18 años, más de 240 con algún tipo de discapacidad. 5,248 docentes
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 154,456 USD Movilizados: 19,656 USD • \$19,656 USD (ECHO-UE) Requerimientos Netos: 134,800 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Disponibilidad de materiales educativos, didácticos y recreativos para facilitar actividades educativas y de apoyo psicoemocional en el retorno a espacios de aprendizajes protectores de más de 23,525 niños, niñas y adolescentes en 4 municipios más afectados de la provincia Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Proveer Kits de ECD para niños y niñas de primera infancia en círculos infantiles, casitas infantiles y Programa Educa a tu hijo de los municipios de Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías. • Proveer kits de material escolar para niños, niñas y adolescentes de enseñanza general de municipios más afectados. • Proveer kits de recreación para el apoyo socioemocional post-desastre de estudiantes de los centros escolares de municipios más afectados.
POBLACIÓN META	23,525 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 11,292 niñas y 12,233 niños de 1 a 18 años, más de 240 con algún tipo de discapacidad. 5,248 docentes.
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 167,152 USD Movilizados: 31,885 USD <ul style="list-style-type: none"> • \$31,885 USD (ECHO-UE) Requerimientos Netos: 135,267 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo socioemocional post desastre en escuelas para más 23,525 niños, niñas y adolescentes de los 4 municipios de Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar al personal docente para que brinden una adecuada educación para la atención socioemocional post desastre a los niños, adolescentes y jóvenes afectados. • Elaborar y difundir materiales transmedia para favorecer el bienestar integral de NNA y un retorno a clases.
POBLACIÓN META	23,525 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 11,292 niñas y 12,233 niños de 1 a 18 años, más de 240 con algún tipo de discapacidad. 5,248 docentes
DURACIÓN DEL PROYECTO	6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 72,480 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: 72,480 USD
CONTACTO	Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba Email: a.lemaistre@unesco.org

LOGÍSTICA

AGENCIA	PMA – Programa Mundial de Alimentos
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo a la recuperación inmediata de las capacidades de almacenamiento y logísticas que contribuyan a la seguridad alimentaria y a las operaciones de respuesta a la emergencia incluyendo respaldo energético con enfoque sostenible para servicios básicos.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la entrega de carpas para facilidades temporales a la población afectada y puestos de dirección de operaciones de respuesta. • Contribuir a la recuperación de las capacidades de almacenamiento y distribución, enfatizando en los almacenes de los municipios más afectados mediante almacenes móviles con pallets y luminarias. • Contribuir al fortalecimiento de capacidades para el respaldo energético de las comunicaciones y otros servicios básicos en situaciones de emergencia mediante el uso de generadores diésel y paneles solares. • Fortalecer las capacidades logísticas en la cadena de distribución de mediante la adquisición de neumáticos y baterías.
POBLACIÓN META	478,328 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$1,500,335 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$1,500,335 USD
CONTACTO	Etienne Labande, Representante PMA-Cuba Email: etienne.labande@wfp.org / Teléfono: +53 7 204 2039

AGENCIA	PMA – Programa Mundial de Alimentos
TÍTULO DEL PROYECTO	Provisión de combustible para garantizar los servicios de transportación asociados a la respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Oscar.
OBJETIVO(S)	Apoyar la facilidad de combustible para garantizar los servicios de transportación de asociados a la respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Oscar desde las entidades de Gobierno a cargo de la logística de esta operación de emergencias, así como el funcionamiento de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba (4000 TM).
POBLACIÓN META	n/a
DURACIÓN DEL PROYECTO	6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$4,000,000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$4,000,000 USD
CONTACTO	Etienne Labande, Representante PMA-Cuba Email: etienne.labande@wfp.org / Teléfono: +53 7 204 2039

SALUD

AGENCIA	OPS/OMS – Organización Mundial de la Salud
TÍTULO DEL PROYECTO	Acceso a servicios de calidad restablecidos con capacidad operativa en las instituciones de salud más afectadas de Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Proveer equipamiento y suministros esenciales para apoyar la rehabilitación de las funciones de las unidades de salud identificadas en las áreas afectadas por el huracán. • Promover acciones para prevenir enfermedades infecciosas y eventos epidemiológicos. • Contribuir a minimizar la morbilidad provocada por el consumo de agua no potable y una deficiente higiene, tales como las enfermedades de transmisión hídrica y por contacto en las instituciones de salud.* <p>(*) 1 hospital en Baracoa, 4 policlínicos y 33 consultorios médico de familia en los 4 municipios afectados.</p>
POBLACIÓN META	478,328 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 1,420,000 USD Movilizados: 430,000 USD <ul style="list-style-type: none"> • (Solicitud al CERF en curso) • \$35,000 USD (Recursos propios) Requerimientos Netos: 990,000 USD
CONTACTO	Dr. Mario Cruz Peñate, Representante OPS-OMS-Cuba Email: cruzmari@paho.org

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo al fortalecimiento de la atención a la salud materno-infantil luego del paso del huracán Oscar en Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer las capacidades del sistema provincial de salud y la revitalización de los servicios esenciales de salud materno-infantil del territorio a través de la adquisición de equipos, medicamentos y suministros médicos críticos. • Apoyar la prevención de infecciones comunitarias y la promoción de cuidados adecuados en los primeros 1000 días de la vida, con participación comunitaria.
POBLACIÓN META	TOTAL: 115,282 personas: 109,482 niñas y niños (de 0 a 18 años) y 5,800 embarazadas y madres que dan de lactar.
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 1,000,000 USD Movilizados: 91,000 USD <ul style="list-style-type: none"> • \$91,000 USD (Recursos propios) Requerimientos Netos: 909,000 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNFPA – Fondo de Población de las Naciones Unidas
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo inmediato al restablecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en los municipios Imías, Maisí, San Antonio del Sur y Baracoa de la provincia Guantánamo.
OBJETIVO(S)	Contribuir a la revitalización inmediata de los servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención y atención de las violencias por motivo de género, principalmente los servicios de salud materna en hospitales y áreas de salud, los servicios de planificación familiar y de atención a las ITS/VIH y atender las necesidades de higiene de mujeres en edad reproductiva con énfasis en embarazadas, de adolescentes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI y adultas mayores, desde un enfoque de género y derechos.
POBLACIÓN META	TOTAL: 149,693. Dentro de ellas, focalizando en: <ul style="list-style-type: none"> • Mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) 32 143, • Adolescentes varones (10 a 19 años) 9447 • Adolescentes mujeres (10 a 14 años) 4753 • Adultas mayores (mujeres de 60 años y más): 32 509 <p>La propuesta también supone alcanzar personas con discapacidad, mujeres con hijos que viven solas, personas LGBTI. Desde un enfoque interseccional se identificarán dentro de estos grupos las personas que requieran apoyo.</p>
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: 700,000 USD Movilizados: 158,000 USD <ul style="list-style-type: none"> • \$130,000 USD (Solicitud al CERF) • \$28,000 USD (Recursos propios) Requerimientos Netos: 542,000 USD
CONTACTO	Marisol Alfonso de Armas, Jefa de la Oficina de UNFPA en Cuba Email: alfonso@unfpa.org

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

AGENCIA	PMA – Programa Mundial de Alimentos
TÍTULO DEL PROYECTO	Asistencia alimentaria inmediata para la población de la provincia de Guantánamo, con énfasis en los 4 municipios más afectados y en la prevención de la malnutrición de grupos priorizados y más vulnerables.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar asistencia alimentaria inmediata a las comunidades más afectadas para evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones con énfasis en los más vulnerables. • Contribuir a la prevención de la malnutrición por deficiencia de micronutrientes con la distribución de suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo) a niñas y niños de 6 a 23 meses. • Apoyar la elaboración de alimentos en los centros de evacuación y comedores comunitarios habilitados para la elaboración de alimentos en las comunidades. • Fortalecer las necesidades inmediatas de cocción de alimentos de las familias más afectadas. • Mantener la entrega del módulo de arroz, granos y aceite a personas en situación de vulnerabilidad y mujeres embarazadas con frecuencia bimestral.
POBLACIÓN META	<p>478,328 personas</p> <p>1er mes (respuesta inmediata):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 478,328 personas; toda la población de la Provincia Guantánamo con 1kg de arroz y 0.5 Kg de granos por personas y 1L de aceite por núcleo familiar, como complemento de los aseguramientos gubernamentales previstos. Esto incluye la entrega de alimentos (arroz, granos, aceite) en apoyo a los centros de evacuación y otros centros habilitados para la elaboración de raciones diarias para la población más afectada (San Antonio del Sur, Imías, Barcaoa y Maisí). • Entrega inmediata de sets de cocina para familias más afectadas que perdieron sus medios de vida. <p>2do mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 149,693 personas; módulo de alimentos para toda la población de los 4 municipios más afectados en la Provincia de Guantánamo (San Antonio del Sur, Imías, Barcaoa y Maisí). Se mantiene entrega de alimentos (arroz, granos, aceite) complementaria en apoyo a los centros de evacuación y otros centros habilitados para la elaboración de raciones diarias para la población más afectada. <p>3ro al 6to mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31,733 personas de grupos vulnerables (ancianos mayores de 65 años, niños menores de 5 años y embarazadas). • 20,000 personas atendidas en centros de evacuación y comedores comunitarios habilitados para la elaboración de alimentos en las comunidades y por Redes de Protección Social (Cir. Infantiles, escuelas primarias, Hogares Maternos, Sistemas de Atención a la Familia, Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos). • 5,884 infancias de 12- 23 meses serán beneficiadas con suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo de 15 microelementos) para cubrir tres ciclos. <p>2do al 18vo mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21,638 personas en situación de vulnerabilidad económica y mujeres embarazadas de la provincia de Guantánamo; recibirán el módulo bimestral del PMA (arroz, granos y aceite) como complemento de la canasta familiar normada del gobierno. • 3,018 infancias de 6- 11 meses serán beneficiadas con suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo de 5 microelementos) para dos ciclos.
DURACIÓN DEL PROYECTO	<p>18 meses* (6 meses fase de emergencia y 12 meses de recuperación)</p> <p>(*) en este periodo la operación se apalanca con otros proyectos que implemente el PMA en la provincia de Guantánamo conectando la producción local de alimentos con el suministro a las redes de protección social, contribuyendo al acompañamiento de estas instituciones y de las formas productivas durante recuperación y fortalecimiento. Igualmente se llevará a cabo una estrategia coordinada con UNICEF para la distribución de Micronutrientes en Polvo, reforzando la prevención de la malnutrición y potenciando la integralidad de los apoyos con un enfoque nutricional.</p>
PRESUPUESTO (US\$)	<p>Total: \$4,953,513 USD</p> <p>Movilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.4 millones USD (IRA) – en proceso de evaluación • Pendiente solicitud al CERF <p>Requerimientos Netos: \$ USD</p>
CONTACTO	<p>Etienne Labande, Representante PMA-Cuba</p> <p>Email: etienne.labande@wfp.org / Teléfono: +53 7 204 2039</p>

AGENCIA	UNICEF – Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo a mejora del estado nutricional de poblaciones vulnerables en comunidades de Guantánamo afectadas por el paso del huracán Oscar.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir al acceso a suplementos nutricionales de niñas y niños de dos a cinco años, así como de mujeres embarazadas y que lactan a través de la adquisición y distribución de Polvos de Múltiples Nutrientes y tabletas prenatales en comunidades afectadas de Guantánamo. • Apoyar la promoción de la lactancia materna exclusiva y prácticas adecuadas de alimentación complementaria en la provincia. • Fortalecer las capacidades del sistema de salud en el territorio para la vigilancia del estado nutricional de la embarazada, la madre que lacta y niñas y niños menores de cinco años.
POBLACIÓN META	TOTAL: 33,640 22,040 niñas y niños entre dos y cinco años; 11,600 mujeres embarazadas y madres lactantes.
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$346,892 USD Movilizados: 46,892.40 USD <ul style="list-style-type: none"> • \$46,892.40 USD (Recursos propios) Requerimientos Netos: \$300,000 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto para la seguridad alimentaria y nutricional de más de 140 000 pobladores de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la recuperación de la producción local de cultivos de ciclo corto (semillas, herramientas e insumos agrícolas para la restauración de casas de cultivos) para la seguridad alimentaria y nutricional de más de 140 000 pobladores de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo. • Acompañar el fortalecimiento de capacidades de productores y productoras para incrementar la resiliencia de los ecosistemas productivos de los territorios afectados sobre buenas prácticas y mejoramiento del manejo eficiente de los suelos, el agua y la energía en la producción de alimentos ante situaciones de emergencia. • Rehabilitación de los medios de vida de las personas del sector agrícola afectadas por el Huracán Oscar en los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo
POBLACIÓN META	6,850 beneficiarios directos de 104 unidades productivas.
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$800,000 USD Movilizados: 400,000 USD en proceso de evaluación <ul style="list-style-type: none"> • Pendiente solicitud al CERF Requerimientos Netos: \$400,000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación de los medios de vida de la población del sector agroforestal afectadas por el Huracán Oscar en los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la recuperación de los medios de vida de las personas afectadas por el huracán en el sector agroforestal. • Apoyar las medidas locales en el sector agroforestal para proveer medios de vida alternativos a los productores de café, cacao y coco, en actividades de reforestación agroforestal.
POBLACIÓN META	2,518 beneficiarios directos de 53 bases productivas
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$500,000 USD Movilizados: - 200 000 USD (en proceso de movilización de los mecanismos de respuesta de la FAO) Requerimientos Netos: \$500,000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación de los medios de vida de las personas del sector ganadero (ganado menor) afectadas por el Huracán Oscar en los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la rehabilitación de instalaciones ovino y caprino para la recuperación de la producción local proteína de origen animal para la seguridad alimentaria y nutricional de más de 140 000 pobladores de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo. • Apoyar con asistencia técnica el incremento de la resiliencia en la producción ganadera con enfoque de Una salud en los territorios afectados para enfrentar futuros eventos extremos.
POBLACIÓN META	1629 beneficiarios directos de 24 unidades productivas
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$500,000 USD Movilizados: - 200 000 USD (en proceso de movilización de los mecanismos de respuesta de la FAO) Requerimientos Netos: \$500,000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación de la producción sostenible pesquera de la población afectada por el Huracán Oscar en Baracoa en Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la recuperación de los medios de vida de las trabajadoras y trabajadores del sector pesquero, con la rehabilitación de las capacidades de procesamiento de productos del mar. • Contribuir al incremento de la resiliencia de la producción pesquera en la UEB Baramar y pescadores privados de bases de pesca asociados a PESCAGUAN en Baracoa.
POBLACIÓN META	114 beneficiarios directos de la UEB Baramar y 51 pescadores privados de bases de pesca asociados a PESCAGUAN en Baracoa.
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$500,000 USD Movilizados: - 100 000 USD (en proceso de movilización de los mecanismos de respuesta de la FAO) Requerimientos Netos: \$500,000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411



Foto: Primada Visión

**PLAN
DE ACCIÓN
SISTEMA DE NACIONES
UNIDAS EN CUBA**

**RESPUESTA A HURACÁN OSCAR
OCTUBRE 2024**

